

## “彩虹屋校舍美化”项目 2025 年度结项报告



项目支持：厦门市立达信泉水慈善基金会

项目执行：玉树州热哇慈善会



## 目录

|   |    |
|---|----|
| 一、项目名称.....                             | 1  |
| 二、执行周期.....                             | 1  |
| 三、执行区域.....                             | 1  |
| 四、项目背景.....                             | 1  |
| 五、执行机构.....                             | 2  |
| 六、项目执行情况.....                           | 2  |
| 七、人员能力提升.....                           | 5  |
| 八、执行费用：.....                            | 5  |
| 九、财务管理.....                             | 6  |
| 十、项目管理.....                             | 6  |
| 十一、项目成果.....                            | 8  |
| 十二、图文展示.....                            | 11 |
| 十三、附件 1：《2025 年彩虹屋校舍美化项目收入明细表》<br>..... | 17 |



## 一、项目名称

彩虹屋校舍美化

## 二、执行周期

2025年3月—2025年12月

## 三、执行区域

青海省玉树藏族自治州（杂多县、称多县、囊谦县、治多县、曲麻莱县 30 所学校。

## 四、项目背景

玉树藏族自治州位于青海省西南部，地处青藏高原腹地，平均海拔高达 4493.4 米。这里高寒缺氧，昼夜温差大，紫外线强烈，气候条件十分严峻。在偏远的高原牧区，部分乡镇学校（包括幼儿园、教学点及支教点）的校舍因常年受恶劣自然环境影响，房屋风化加速，屋顶开裂、漏水严重，墙面因渗水而发霉、墙皮脱落，不仅影响美观，更严重干扰了师生的正常教学与生活。

由于地方教育经费有限，学校难以频繁进行修缮。每逢夏季雨季，师生们只能无奈面对“屋外大雨滂沱，室内小雨淅沥”的窘境；而冬季冰雪融化时，雪水渗入墙体，更使室内潮湿阴冷，雪上加霜。

为切实改善高海拔偏远牧区学校的校舍问题，立达信泉水慈善基金会与玉树州热哇慈善会共同发起“可可西里的温暖——彩虹屋校舍美化”项目。该项目致力于从根源上解决玉树地区乡村学校漏雨渗水难题，为助力当地教育振兴提供有力保障，也让更多牧区学子感受到来自社会的关怀与温暖。



## 五、执行机构

玉树州热哇慈善会

## 六、项目执行情况

1、项目第一期：2025年3月至9月15日，在这五个月的时间里，项目团队和施工团队和高原的雨季赛跑，最终在9月底完成了本年度项目第一期项目施工，为杂多县、称多县、囊谦县共24所学校完成防水修缮，修缮总面积35001平方米，受益人数达14000+人。

现将“彩虹屋校舍美化”项目第一期施工完成情况列示如下：

| 所属县  | 学校名称           | 修缮场所      | 修缮材料     | 预算面积    | 实际修缮面积 | 备注    |
|------|----------------|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 杂多县  | 结多乡中心<br>寄校    | 教学楼       | SBS 防水卷材 | 1157.5  | 1134   | 已完成修缮 |
|      | 杂多县实验<br>学校    | 教学楼       | SBS 防水卷材 | 4086    | 3699   | 已完成修缮 |
|      | 阿多乡中心<br>寄宿制学校 | 宿舍        | SBS 防水卷材 | 976.19  | 909    | 已完成修缮 |
|      | 扎青乡中心<br>寄校    | 男女宿舍      | SBS 防水卷材 | 385.56  | 396    | 已完成修缮 |
|      | 杂多县第一<br>完小    | 综合<br>教学楼 | SBS 防水卷材 | 470     | 504    | 已完成修缮 |
| 合计面积 |                |           |          | 7075.25 | 6642   |       |

| 所属县 | 学校名称          | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积    | 实际修缮面积 | 备注    |
|-----|---------------|------|----------|---------|--------|-------|
| 治多县 | 治多县希望<br>小学   | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 4534.84 | 3699   | 已完成修缮 |
|     | 治多县第二<br>民族中学 | 教学楼  | 树脂瓦材料    | 896.25  | 864    | 已完成修缮 |
|     | 治多县城南<br>幼儿园  | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1775.81 | 1674   | 已完成修缮 |
|     | 治多县东城<br>幼儿园  | 教学楼  | 树脂瓦材料    | 992.08  | 927    | 已完成修缮 |
|     | 治多县索加         | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1659.95 | 1647   | 已完成修缮 |



|      |       |  |  |         |      |  |
|------|-------|--|--|---------|------|--|
|      | 乡寄宿小学 |  |  |         |      |  |
| 合计面积 |       |  |  | 9858.93 | 8811 |  |

| 所属县  | 学校名称         | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积     | 实际修缮面积 | 备注    |
|------|--------------|------|----------|----------|--------|-------|
| 称多县  | 称多县珍秦镇中心寄宿学校 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 2447.92  | 2565   | 已完成修缮 |
|      | 称多县民族完全小学    | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1437.55  | 1485   | 已完成修缮 |
|      | 称多县扎朵镇中心幼儿园  | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1643.28  | 1341   | 已完成修缮 |
|      | 称多县尕乡岗由村幼儿园  | 教学楼  | 树脂瓦钢架    | 675.5    | 873    | 已完成修缮 |
|      | 称多县卓木其村教学点   | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 781.92   | 873    | 已完成修缮 |
|      | 称多县中心幼儿园     | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 2170.56  | 2268   | 已完成修缮 |
|      | 称多县尕乡中心寄宿制学校 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1862.7   | 1629   | 已完成修缮 |
| 合计面积 |              |      |          | 11019.43 | 11034  |       |

| 所属县 | 学校名称          | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积    | 实际修缮面积 | 备注    |
|-----|---------------|------|----------|---------|--------|-------|
| 囊谦县 | 囊谦县香达镇寄宿制学校   | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 3467.25 | 3096   | 已完成修缮 |
|     | 囊谦县白扎乡查哈幼儿园   | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 481.12  | 495    | 已完成修缮 |
|     | 囊谦县第一民族中学     | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 2621.9  | 2673   | 已完成修缮 |
|     | 囊谦县觉拉乡第二寄宿制小学 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1113.28 | 1098   | 已完成修缮 |
|     | 囊谦县娘拉乡多伦多幼儿园  | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 564.09  | 0      | 已完成修缮 |



|      |             |     |          |         |      |       |
|------|-------------|-----|----------|---------|------|-------|
|      | 囊谦县尕羊乡尕麦幼儿园 | 教学楼 | SBS 防水卷材 | 411     | 423  | 已完成修缮 |
|      | 囊谦县东坝乡热拉幼儿园 | 教学楼 | SBS 防水卷材 | 432     | 729  | 已完成修缮 |
| 合计面积 |             |     |          | 9090.64 | 8514 |       |

2、项目第二期：2025年9月底至11月初，在这1个月的时间里，项目团队和施工团队克服重重困难，加快进度，最终在11月初大雪来临前完成了本年度项目第二期项目施工，囊谦县、称多县、曲麻莱县共7所学校完成防水修缮，修缮总面积**7029.56**平方米，受益人数达1739人。

现将“彩虹屋校舍美化”项目第二期施工完成情况列示如下：

| 所属县  | 学校名称        | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积 | 实际修缮面积 | 备注    |
|------|-------------|------|----------|------|--------|-------|
| 玉树市  | 玉树市禅古村第一幼儿园 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 493  | 493    | 已完成修缮 |
| 合计面积 |             |      |          | 493  | 493    |       |

| 所属县  | 学校名称      | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积   | 实际修缮面积 | 备注    |
|------|-----------|------|----------|--------|--------|-------|
| 囊谦县  | 觉拉乡卡荣尼幼儿园 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 538.22 | 538.22 | 已完成修缮 |
| 合计面积 |           |      |          | 538.22 | 538.22 |       |

| 所属县  | 学校名称          | 修缮场所           | 修缮材料     | 预算面积    | 实际修缮面积  | 备注    |
|------|---------------|----------------|----------|---------|---------|-------|
| 称多县  | 称多县歇武镇九年一贯制学校 | 综合教学楼<br>女生宿舍楼 | SBS 防水卷材 | 1105.14 | 1105.14 | 已完成修缮 |
|      | 扎朵镇革新村小学      | 教学楼            | SBS 防水卷材 | 410     | 410     | 已完成修缮 |
|      | 称多县文乐中心寄宿制学校  | 教学楼            | SBS 防水卷材 | 842.50  | 842.50  | 已完成修缮 |
| 合计面积 |               |                |          | 2357.64 | 2357.64 |       |



| 所属县  | 学校名称      | 修缮场所 | 修缮材料     | 预算面积    | 实际修缮面积  | 备注    |
|------|-----------|------|----------|---------|---------|-------|
| 曲麻莱县 | 曲麻莱县第一幼儿园 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 2288.70 | 2288.70 | 已完成修缮 |
|      | 曲麻莱县第三幼儿园 | 教学楼  | SBS 防水卷材 | 1352.00 | 1352.00 | 已完成修缮 |
| 合计面积 |           |      |          | 3640.70 | 3640.70 |       |

总述:本项目 2025 年度修缮学校 30 所,共计修缮总面积 42030.56 平方米,共计投入修缮资金 2,239,099.8 元,年度项目支出金额 2,656,430.40 元。

## 七、人员能力提升

依托开展慈善活动公益救助工作所需经费 10 万元,我们组建专业骨干团队全力推进项目落地。通过专人负责、闭环管理,确保了问题响应与解决的效率,从而有力地保障了项目综合能力与业务目标的达成。

## 八、执行费用:

投入项目执行费用 195,009.69 元,在海拔 4000 米的高原地区,稳固的资金支持是项目顺利执行的战略基石,尤其体现在克服最关键的交通与物资保障瓶颈上。项目团队需高频次深入偏远地区,每次任务均由 4-8 人组成小队,配备双车以策安全,长途穿越数百公里无人区。在此极端环境下,交通工具的可靠性直接关系到任务成败与人员安全。

若无充足的预算保障以维持车辆安全情况、配备专业救援方案,任何突发故障都将直接转化为导致项目中断的系统性风险,并严重威



胁团队成员的人身安全。因此，确保执行费用，就是为整个项目构建最根本的风险抵御能力。

## 九、财务管理

我慈善会设立“彩虹屋校舍美化”项目专项科目，实行独立核算、闭环管理，与其他项目资金严格区分。

项目资金收支和使用情况具体详见附件《2025年彩虹屋校舍美化项目收入明细资金使用表》、《2025年彩虹屋校舍美化项目支出明细资金使用表》。依照本机构与厦门市立达信泉水慈善基金会的协议约定，按项目实际支出为准财务收支明细表。

## 十、项目管理

学校防水修缮项目管理至关重要，不仅要保障校园建筑的正常使用，还要尽量减少对教学秩序的影响。

1、前期调研与规划：全面勘查前期与学校负责人、后勤、基建等相关部门沟通，了解校内建筑的使用年限、既往漏水渗水问题等。实地检查教学楼、宿舍等建筑的屋面、外墙等部位的渗漏情况，拍照、记录位置与严重程度，并进行实地测量和记录。

2:制定方案：依据勘查结果，结合预算和周期要求，制定详细修缮方案。选择合适的防水材料，如屋面可用SBS防水卷材。明确施工工艺，像屋面需先清理原有基础层面，再做防水层、保护层等。

3、协调时间：综合考虑项目周期、每个学校的时间安排、漏水的严重程度、学校距离远近等因素，制定详细的施工进度计划，明确各阶段的起止时间与修缮任务。



4、材料管理与把控材料采购：选择有资质、信誉好的供应商，采购符合国家标准的防水材料，要求提供产品合格证、检测报告等。严格把控材料进场，对每批次材料进行抽检，确保质量。

5、施工过程管理人员管理：挑选经验丰富、技术熟练的施工人员，施工方要求入场前进行安全和技术培训，使其熟悉学校施工的特殊要求和修缮工艺。明确各人员职责，如施工方负责现场管理，技术的质量把控、人员安全等。

6、修缮质量管理：严格按照施工方案和工艺标准施工，加强对关键工序的质量检查。屋面防水施工时，注意卷材的搭接宽度和粘贴牢固程度。在施工过程中，对于部分学校的特殊楼体、楼面、屋顶情况，项目团队经过再次实地考察和沟通后，做出针对性的解决方案，确保工程保质保量地顺利进行。

7、安全与环境管理：在施工现场设置明显的安全警示标志，拉设警戒线，防止学生误入。做好施工人员的安全防护，如佩戴安全帽、高空作业锁好防护等。

8、验收与交付验收标准：施工完成后，项目团队依据国家防水工程验收规范和项目的修缮要求进行验收（执行方热哇慈善会对每一所学校进行工程验收，捐赠方厦门市立达信泉水慈善基金会择期对部分学校进行回访和验收，教育部门第三方工程验收机构对部分学校进行工程验收表）。检查防水层的外观是否平整、有无气泡、裂缝等缺陷，检验防水效果。

9:资料整理：整理项目的相关资料，包括各学校修缮申请、项目



预算、施工方案、进出场记录等上传。

10、后期维护回访机制：建立回访制度，在项目交付后的一定时间内(项目确定 5 年内)定期回访学校，了解防水修缮后的使用情况，并及时处理出现的问题。

11、质量保修：按照合同约定的 5 年为保修期限范围，对出现质量问题的位置进行质保维修。分析问题产生的原因，总结经验教训，为后续项目提供参考。

## 十一、项目成果

1、为童年遮风挡雨，用彩虹筑就温暖——厦门市立达信泉水慈善基金会“彩虹屋校舍美化”项目五年回顾，时光荏苒，初心如磐。当我们将目光回望至青海玉树的群山之间，厦门市立达信泉水慈善基金会发起并坚守的“彩虹屋校舍美化”项目，已然走过了五个充满信念与感动的春秋。这五年，是一场关于守护的漫长跋涉，也是一首用切实行动写就的温暖诗篇。

项目的初衷朴实而坚定——为偏远地区的校舍解决“防水漏水”这一最基础却又最关键的难题。我们深知，一间不再漏雨的教室，是孩子们安心读书、无畏风雨的最基本保障。五年的时光，正是基金会这份不变的坚持，将“从第一所到一百所”的数字里程碑，化为了覆盖青海玉树边边角角的坚实守护网。

“彩虹屋”之名，寓意着风雨过后终见彩虹。我们不仅用防水材料为校舍撑起了一把“保护伞”，更用色彩与绘画美化这片来之不易的干爽天地，让温暖的守护具象化为墙面上绚烂的彩虹。这不仅是校



舍的物理美化，更是为孩子们的心灵注入一抹亮色，告诉他们：无论外界风雨如何，都有一方温暖、坚固的天地为他们存在。

回首这五年，最让我们动容的，是那些真切的变化：从前的“外面下大雨，里面下小雨”的窘境不复存在；孩子们不必再在漏雨的教室里挪动课桌；老师们能安心地将教学用具挂在墙上……这些看似微小的改变，背后是彩虹屋校舍美化计划持之以恒的付出，是爱心汇聚的力量。

一百所坚固、温暖的“彩虹屋”，是厦门市立达信泉水慈善基金会五年耕耘的丰碑，也是一份交付给孩子们未来的踏实承诺。我们为此间的所有坚持与收获深深感动。前路漫漫，这份为童年遮风挡雨的使命，我们将继续肩负，让更多的“彩虹”绽放在需要它的土地之上。

2、为开拓眼界，厦门市立达信泉水慈善基金会、玉树州热哇慈善会项目团队专程赴上海参加防水博览会，深度考察前沿材料与工艺。我们深知，真正的价值在于将这些先进技术，用于守护最需要的地方。在此，我们寻找“彩虹屋校舍美化计划”项目的长期支持厂家与合作单位。通过分享交流“彩虹屋校舍美化计划”项目，该计划致力于为乡村老旧校舍进行根本性防水改造，解决常年渗漏、环境湿暗的难题，为孩子们创造干爽、明亮、彩色的学习空间，希望通过交流能够得到更多的支持。在上海放水博览会传播公益性防水项目是一件很有意义的事情，让更多专业防水行业知道在青藏高原上，“彩虹屋校舍美化”项目是一个有温度的公益防水项目。

3、“彩虹屋校舍美化”自2019年实施以来，在五年间已覆盖青



海玉树藏族自治州一市五县的 100 所高原学校。该项目切实解决了困扰高原学校多年的实际困难。修缮前，许多学校因经费短缺和专业队伍匮乏，师生常年饱受“屋外大雨，屋内小雨”的困扰，冬季渗水结冰更是严重影响教学与生活。项目通过引入专业工程队伍，采用可靠的防水材料与工艺进行系统性修缮，效果显著且持久。各县教育局与学校负责人对此给予了高度评价。自 2019 年项目帮助修缮后，校舍屋顶四年来再未出现漏水，“效果非常好，表达着感激之情”。缮后教室干净整洁，师生们终于可以温暖过冬。该项目被当地教育工作者誉为一场“从东南沿海到三江之源”的温暖公益接力，不仅修补了校舍的裂缝，更温暖了高原的课堂。

4、多年来，“彩虹屋校舍美化”项目的工人他们奔波于医院与家之间，生活的重心是一张张化验单和一份份药物清单。为了孩子能迎来下一个明天，他们倾尽所有，而“工作”与“收入”成了无暇顾及的奢望。

我们深知，对于这些有肿瘤患儿和脊柱侧弯患儿的家庭，漫长的治疗之路，不仅是意志的考验，更是经济的重压。那些昂贵的药物，是希望，也是沉甸甸的负担。

因此，“彩虹屋校舍美化”项目，更是一份特别的支持行动。我们特意将施工的机会，交到这些可敬的父母手中。

这不仅仅是一笔收入，这是让他们在照顾孩子的间隙，能用自己的双手，稳稳地挣来一份药费、一份生活保障，在艰难中重获一丝喘息的空间和尊严。





这更是一种力量的传递。当他们为校园挥洒汗水，修缮屋顶时，他们不仅是在建造一个美丽的空间，更是在亲手构筑“自力更生”的信心，为孩子、也为自己，画出生活新的色彩。

这座即将诞生的彩虹屋，它的每一道色彩，都由坚韧、爱与希望调和而成。它由父母们的双手筑起，也必将成为照亮孩子们未来的一道光芒。

2025年，项目共组织12名这类家庭的家长，参与称多县、杂多县、曲麻莱县等区域2.6万余平方米的校舍修缮工作；工期从5月持续至10月底（近6个月），相关施工支出近40万元。按实际出勤核算，参与家长平均每日劳动所得220元，累计每人增收约3.3万元。

让我们共同见证，爱如何在这种循环中，生生不息。

## 十二、图文展示





# རྩོད་རྗེས་སློབ་གསོ་རྒྱུ་ཡིག་ཀྱི་

## 杂多县教育局文件

### 感谢信

厦门市立达信泉水慈善基金会：

三江之源，恩情肇始。澜沧江水从此奔涌，如贵基金会跨越山海的善意，滋养着雪域的教育沃土。杂多县教育局谨代表全县师生，向贵会致以源头般真挚的感谢与崇高的敬意！

多年来，贵会实施的“彩虹屋校舍美化计划”，如朝霞映亮冰川，为澜沧江畔的校园披上了温暖绚丽的衣裳。这份始于源头的深情，不仅美化了江源校舍，更在孩子们心中播下了美的涟漪，为玉树教育事业注入了清澈而坚韧的力量。我们将永怀感恩，让教育之光如澜沧江水，奔流不息。

诚邀贵会常回澜沧江源头看看，共溯善行之源，同览江河之远。



# ལྷོ་ཁྱུ་དམར་ལེབ་རྩོད་སློབ་གསོ་རྒྱུ་

## 曲麻莱县教育局

### 感谢信

尊敬的厦门市立达信泉水慈善基金会：

衷心感谢贵基金会“彩虹屋校舍美化计划”对我县校舍修缮工作的大力支持！我校地处青海玉树州曲麻莱县高海拔地区，常年面临严寒、风雨等自然条件的严峻考验。多年来，贵基金会始终如一地关心和帮助我校，为改善学校及幼儿园的学习环境倾注了温暖与力量。


如今，经过修缮的校舍已不再漏水，孩子们拥有了真正遮风挡雨的学习空间。这份宝贵的帮助，不仅改善了校园环境，更让孩子们感受到来自远方的关怀与温暖。再次深深感谢贵基金会的无私援助！愿贵基金会事业蓬勃发展，爱心永驻！

此致

敬礼！





称多县教育局、治多县曲、杂多县、麻莱县教育局感谢信

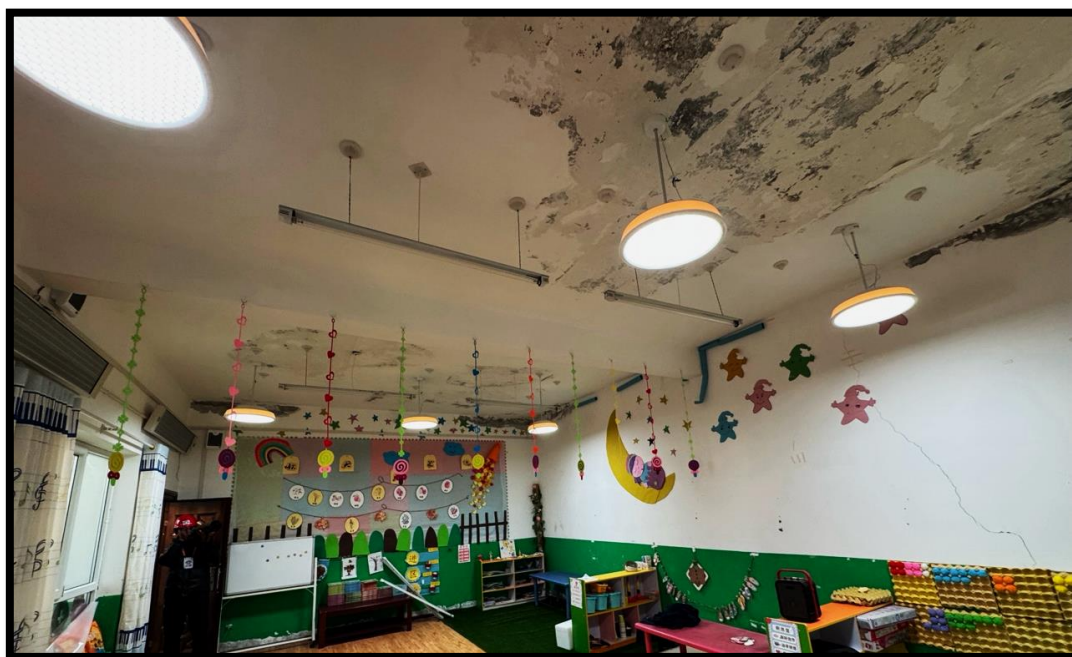

屋顶修缮后玉树市禅古村幼儿园安装好“点亮中国偏乡”项目捐赠的护眼灯



“彩虹屋校舍美化”项目验收中，项目人员检查施工细节

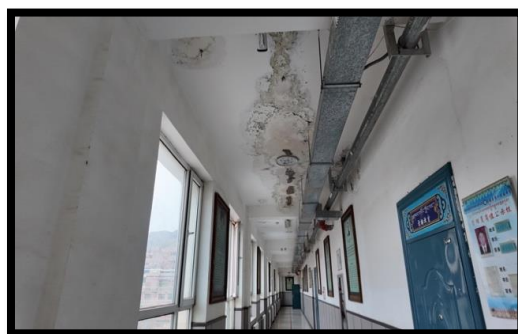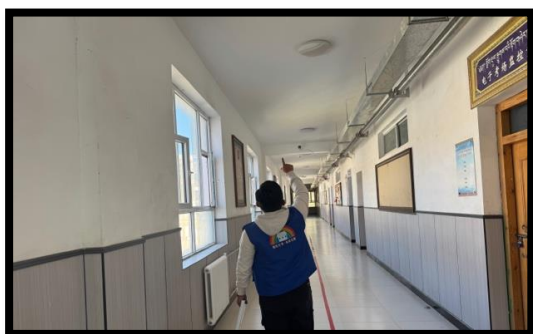

屋顶修缮后粉刷了涂料不在有漏水痕迹（对比）






“彩虹屋校舍美化”项目验收细节施工图，阴阳角附加层粘连牢固



囊谦县一中学校屋顶修缮后前后（对比）



排水孔屋顶修缮后前后（对比）

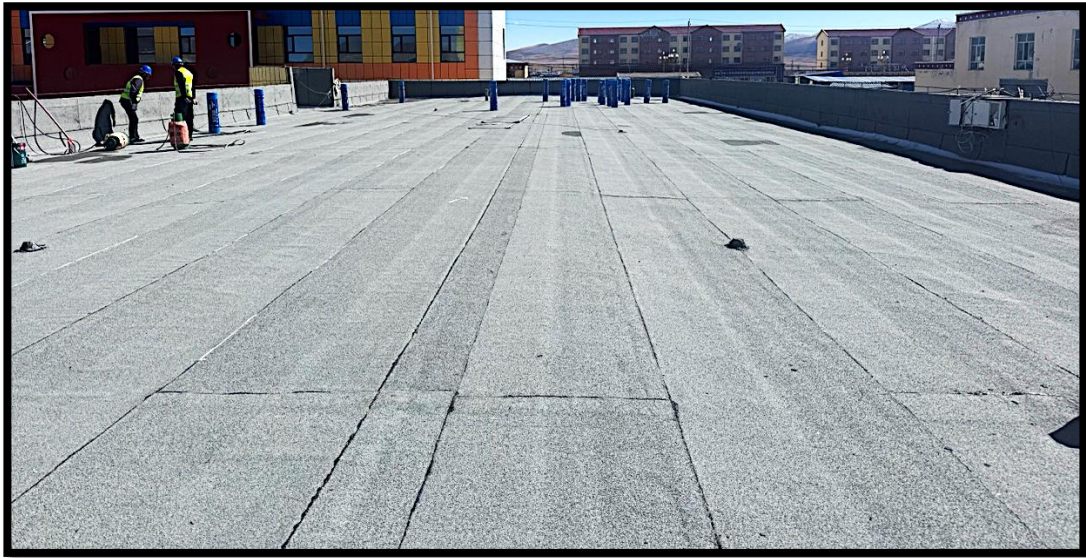

“彩虹屋校舍美化”项目曲麻莱县第三幼儿园施工图





跨越山海厦门市立达信泉水慈善基金会伙伴奔赴  
高原调研学校，海拔 4900 米垭口



8 月厦门市立达信泉水慈善基金会伙伴验收杂多修缮学校  
海拔 4300 米杂多县扎青乡寄宿制学校



第【100】所修缮学校称多县革新村教学点

十三、附件 1：《2025 年彩虹屋校舍美化项目收入明细表》

附件 2：《2025 年彩虹屋校舍美化项目支出明细表》

2025 年彩虹屋校舍美化项目收入明细表

| 摘要  | 金额           | 日期         | 凭证号   |
|---|--------------|------------|-------|
| 24 年“彩虹屋校舍美化”项目第二批尾款                      | 211,803.20   | 2025-01-24 | 记-031 |
| 收“彩虹屋校舍美化”项目 2025 年首款-厦门市立达信泉水慈善基金会       | 1,547,000.00 | 2025-05-08 | 记-068 |
| 收 2025 年“彩虹屋校舍美化”项目第一批项目尾款-厦门市立达信泉水慈善基金会  | 499,936.69   | 2025-11-14 | 记-007 |
| 收 2025 年“彩虹屋校舍美化”项目第二批项目首款”-厦门市立达信泉水慈善基金会 | 273,479.07   | 2025-11-14 | 记-008 |
| 合计  | 2,532,218.96 |            |       |

2025 年彩虹屋校舍美化项目支出明细表

| 编制单位：玉树州热哇慈善会             | 期间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月 |            |       |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 摘要                        | 金额                          | 日期         | 凭证号   |
| 支 2024 年“彩虹屋校舍美化”项目款-玉树市尼 | 119,326.40                  | 2025-02-04 | 记-037 |



|                                     |                     |            |       |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 玛采暖炉总汇                              |                     |            |       |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目下乡燃油费。                  | 1,000.00            | 2025-04-11 | 记-063 |
| 支“彩虹屋校舍美化”下乡油费                      | 1,800.00            | 2025-04-13 | 记-062 |
| 支“彩虹屋校舍美化”下乡执行费用预支-髓海涛              | 10,000.00           | 2025-05-13 | 记-071 |
| 2025年度“彩虹屋校舍美化”项目款(第一期)-玉树市尼玛采暖炉总汇  | 250,000.00          | 2025-05-13 | 记-072 |
| 支25年“彩虹屋校舍美化”项目施工费支出玉树市尼玛采暖炉总汇      | 300,000.00          | 2025-05-18 | 记-076 |
| 支25年“彩虹屋校舍美化”项目施工费支出-玉树市尼玛采暖炉总汇     | 250,000.00          | 2025-05-19 | 记-080 |
| 支2025年“彩虹屋校舍美化”项目施工费支出-玉树市尼玛采暖炉总汇   | 200,000.00          | 2025-05-21 | 记-095 |
| 支下乡车辆维修保养“彩虹屋校舍美化”项目执行费支出-玉树市新轮胎大世界 | 6,600.00            | 2025-06-05 | 记-102 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目执行费-格丁朋措                | 10,000.00           | 2025-06-25 | 记-118 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目下乡费用报销-马安惠              | 12,757.00           | 2025-06-30 | 记-120 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目建大轮胎车辆维护-索南             | 7,560.00            | 2025-07-15 | 记-125 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目执行费用拨付-隋海淘              | 5,000.00            | 2025-07-15 | 记-126 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目下乡报销费用-马安惠              | 15,438.00           | 2025-07-16 | 记-130 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目下乡调研走访费用-格丁朋措           | 10,000.00           | 2025-07-19 | 记-129 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目执行费用拨付-格丁朋措             | 6,000.00            | 2025-08-02 | 记-135 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目-车辆维修费用-彭兵              | 1,100.00            | 2025-08-29 | 记-148 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目执行费用拨付-隋海淘              | 8,000.00            | 2025-09-02 | 记-153 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目款-玉树市尼玛采暖炉总汇            | 200,000.00          | 2025-09-12 | 记-156 |
| 支2025“彩虹屋校舍美化”项目项目款                 | 200,000.00          | 2025-09-13 | 记-157 |
| 支“彩虹屋校舍美化”项目行政费用车辆维修                | 11,000.00           | 2025-11-13 | 记-006 |
| 支2025年“彩虹屋校舍美化”项目第一期尾款-玉树市尼玛采暖炉总汇   | 300,000.00          | 2025-11-15 | 记-009 |
| 支2025年“彩虹屋校舍美化”项目第二期施工款项-玉树市尼玛采暖炉总汇 | 273,479.07          | 2025-11-16 | 记-010 |
| 支2025“彩虹屋校舍美化”项目第一期款项-玉树市尼玛采暖炉总汇    | 177,355.00          | 2025-11-19 | 记-011 |
| <b>合计</b>                           | <b>2,376,415.47</b> |            |       |
